PORTFOLIO TEMPLATE · FINANCE DIRECTOR

13 周滚动现金流预测（示例）

从“看得见”到“管得住”：周度现金流入流出、最低现金保有、缺口预警与动作清单

预测期间：2026-10-01 至 2026-12-31（W1–W13）　主体/范围：某建安企业（示例）本部及 3 个在建项目　金额单位：万元　版本：v1.0 · 示例


示例数据 · 脱敏模拟 · 非真实企业数据　W1–W2 实际　W3–W13 预测　最低现金保有 3,000 万元

5,200 万元	52,800 万元	52,250 万元	550 万元
期初现金（W1 起点）	13 周累计流入	13 周累计流出	累计净现金流

5,750 万元	W5	5	191.67%
第 13 周末现金	最低现金周 · 450 万元	缺口周数 · 累计缺口 9,150 万元	第 13 周末安全线覆盖率

现金曲线

柱：流入/流出；线：期末现金；虚线：最低保有

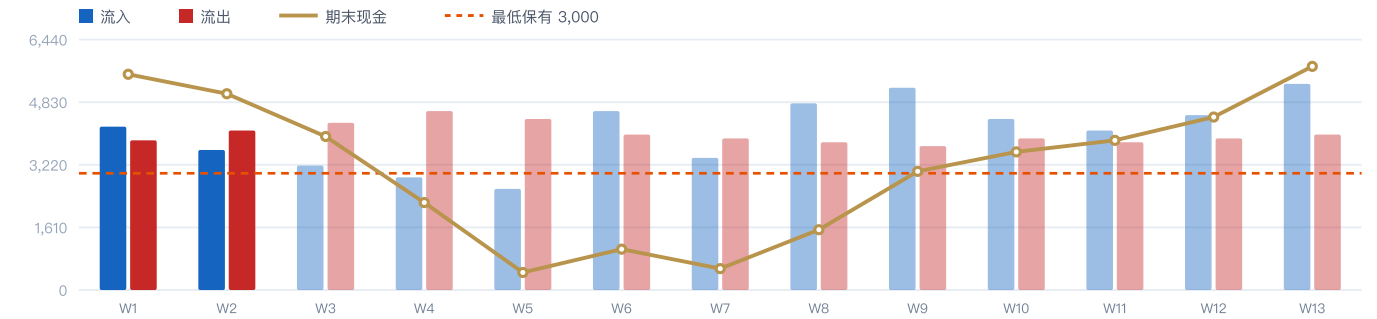

实线/实底 = 实际（W1–W2）；浅色底 = 预测（W3–W13）。缺口定义：当周期末现金低于最低现金保有 3,000 万元时，差额计入缺口。

13 周现金流主表

单位：万元

周次	状态	期初	流入	流出	净现金流	期末	最低保有	缺口	灯
W1	实际	5,200	4,200	3,850	350	5,550	3,000	0	绿
W2	实际	5,550	3,600	4,100	-500	5,050	3,000	0	绿
W3	预测	5,050	3,200	4,300	-1,100	3,950	3,000	0	绿
W4	预测	3,950	2,900	4,600	-1,700	2,250	3,000	750	黄
W5	预测	2,250	2,600	4,400	-1,800	450	3,000	2,550	红
W6	预测	450	4,600	4,000	600	1,050	3,000	1,950	红
W7	预测	1,050	3,400	3,900	-500	550	3,000	2,450	红
W8	预测	550	4,800	3,800	1,000	1,550	3,000	1,450	红
W9	预测	1,550	5,200	3,700	1,500	3,050	3,000	0	绿
W10	预测	3,050	4,400	3,900	500	3,550	3,000	0	绿
W11	预测	3,550	4,100	3,800	300	3,850	3,000	0	绿
W12	预测	3,850	4,500	3,900	600	4,450	3,000	0	绿
W13	预测	4,450	5,300	4,000	1,300	5,750	3,000	0	绿
合计	—	**5,200**	**52,800**	**52,250**	**550**	**5,750**	—	**9,150**	—

自洽：期初 + 净现金流 = 期末；每周期末 = 下周期初；Σ流入 − Σ流出 = Σ净现金流；缺口 = MAX(0, 最低保有 − 期末)。

现金结构

监管内/外 · 受限/非受限

维度	金额（万元）	占比	说明
监管内资金	1,900	33.04%	预售监管账户等
监管外资金	3,850	66.96%	一般账户
总现金	**5,750**	**100.0%**	**监管内 + 监管外**
受限资金	1,450	25.22%	保证金/冻结/质押
非受限资金	4,300	74.78%	可自由调度
可用现金	**4,300**	**74.78%**	**总现金 − 受限**

结论与动作

从数字到管理动作

最低点：W5 期末现金 450 万元，低于最低保有 3,000 万元；共有 5 周出现缺口，累计缺口 9,150 万元。

- 最低点 W5（期末 450 万元），5 周低于保有线，累计缺口 9,150 万元。
- 把 W4–W6 的 3 笔分包付款（2,800 万元）与回款节点挂钩，争取延后 2 周。
- 启用 3,000 万元授信覆盖 W5–W7 缺口；对逾期 60 天应收 1,900 万元专项催收。

关键假设与口径

先写假设，再给结论

回款率：92%（近 12 个月均值）

平均账期：75 天，较合同延后 15 天

工程进度：按月度产值计划，无停工

融资到位：3,000 万元授信 W6 前批复（概率 70%）

固定支出：税费与工资按月支付

最低保有：3,000 万元（约 6 周固定支出）

示例数据声明：本页为方法论演示，所有金额、周次、回款率与融资到位假设均为示例，非真实企业数据。实际使用需替换为银行流水、合同回款计划、工程进度与融资批复，并由财务负责人复核。

集团经营快报（示例）

2026 年 9 月 · 合并范围 20 家项目公司 · 单位：万元


示例数据 · 脱敏模拟
非真实企业数据

235,120 万元	9.00%	10,440 万元	4.44%
合并营业收入	合并毛利率	合并净利润	合并净利率

7,060 万元	5,750 万元	99.40%	16 / 3 / 1
经营现金流合计	期末现金合计	预算完成率（20 家合计口径）	红黄绿灯：绿 / 黄 / 红


净利贡献 Top 10 / Bottom 5

按净利润排名

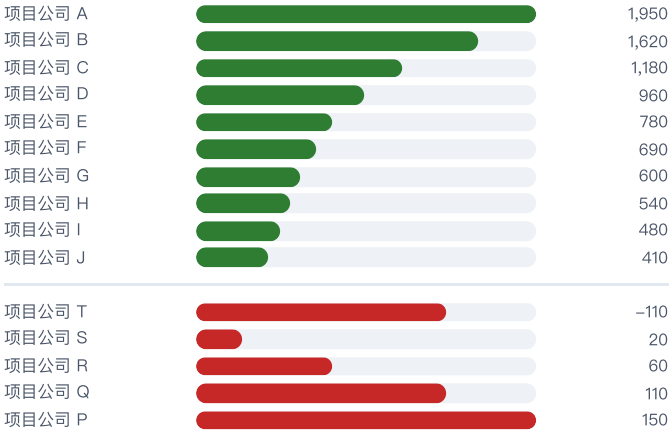

预算偏差 Top 5

实际 − 预算（收入口径）



偏差 = 实际 − 预算；偏差率 = 偏差 / 预算；完成率 = 实际 / 预算。绿色为超预算，红色为低于预算。

20 家项目公司快报

节选全部 20 家 · 排名按净利润

#	项目公司	收入	毛利率	净利率	经营现金流	预算完成率	灯
1	项目公司 A	28,000	12.14%	6.96%	2,100	107.69%	绿
2	项目公司 B	24,500	13.06%	6.61%	1,450	98.79%	绿
3	项目公司 C	21,000	10.95%	5.62%	980	95.45%	绿
4	项目公司 D	19,500	9.74%	4.92%	−320	97.50%	黄
5	项目公司 E	18,000	8.89%	4.33%	640	102.86%	绿
6	项目公司 F	16,500	9.09%	4.18%	520	103.12%	绿
7	项目公司 G	15,000	8.67%	4.00%	410	96.77%	绿
8	项目公司 H	13,800	8.70%	3.91%	360	98.57%	绿
9	项目公司 I	12,500	8.80%	3.84%	300	104.17%	绿
10	项目公司 J	11,200	8.04%	3.66%	260	97.39%	绿
11	项目公司 K	10,000	8.00%	3.50%	210	98.04%	绿
12	项目公司 L	9,200	7.61%	3.37%	180	102.22%	绿
13	项目公司 M	8,400	7.14%	3.21%	150	98.82%	绿
14	项目公司 N	7,600	6.58%	3.03%	120	97.44%	绿
15	项目公司 O	6,800	5.88%	2.79%	90	97.14%	绿
16	项目公司 P	6,000	5.00%	2.50%	60	95.24%	绿
17	项目公司 Q	5,200	3.85%	2.12%	40	98.11%	绿
18	项目公司 R	4,400	2.27%	1.36%	−80	91.67%	黄
19	项目公司 S	3,600	0.00%	0.56%	−150	90.00%	黄
20	项目公司 T	2,520	−5.16%	−4.37%	−260	84.00%	红
—	**合计 / 合并**	**235,120**	**9.00%**	**4.44%**	**7,060**	**99.40%**	—

预算完成率 = 20 家收入合计 ÷ 预算合计（未抵消内部交易）；合并口径的完成率需另行以合并收入为分子。

合并桥（收入）

20 家合计 → 抵消 → 合并

项目	金额（万元）
20 家收入合计	243,720
减：内部交易抵消	−8,600
合并营业收入	**235,120**
20 家成本合计	221,850
减：内部成本抵消	−7,900
合并营业成本	**213,950**

合并桥（净利）

净利合计 → 抵消 → 少数股东 → 归母

项目	金额（万元）
20 家净利润合计	10,790
减：内部利润抵消	−350
减：少数股东损益	−620
归母净利润	**9,820**
经营现金流合计	7,060
期末现金合计	5,750

三条管理结论：净利前 3 家（项目公司 A、项目公司 B、项目公司 C）合计 4,750 万元，占 20 家净利合计的 44.02%；收入完成率 99.40%，但有 4 家经营现金流为负，合计 −810 万元；红灯 1 家（项目公司 T）；内部交易抵消 8,600 万元，月结前须完成对账；归母净利 9,820 万元，少数股东损益 620 万元。

口径：合并范围 20 家；内部交易抵消 8,600 万元；预算版本 2026 年度预算 v3（9 月滚动修订）；红黄绿灯阈值见下。

绿灯：完成率≥95% 且经营现金流≥0；黄灯：85%–95% 或现金流为负但可覆盖；红灯：<85% 或出现缺口。示例阈值，可按集团制度替换。
